

Seurantaraportti

Ajalta 1.9-31.12.2023

Puhdistamontien tason parantaminen

1. Yleistä

Puhdistamontien tason parantamiseksi jätettiin avustushakemus 15.2.2023 P-P liittoon. Hankkeen kokonaiskustannus on 137 152 €. Hankkeelle saatiin 54 860 € avustusta.

Maveplan Oy laati hankkeelle suunnitelmat ja kustannusarvion joka sisälsi Puhdistamontien varsien raivauksen, luiskien kaivuun ja muotoilun, suodatinkankaan asennuksen, kantavan murskeen ja pinta murskeen asennuksen ja lopuksi tien päällystämisen.

Hankkeen aikataulu on 1.6.2023-31.8.2024. Hankkeen ohjausryhmänä toimii tekninen lautakunta.

Hankkeen osalta käytiin 25.8.2023 P-P liiton kanssa aloituspalaveri Teams-palaverina.

Ohjausryhmän aloituskokous pidettiin 5.9.2023.

2. Hankkeen suunnitelmat

Hankkeen suunnitelmat ja kustannusarvio Maveplan Oy valmistuivat 14.2.2023. Hanketta on viety eteenpäin Maveplan Oy:n suunnitelmien mukaisesti.

3. Rakentaminen ajalla 1.9-31.12.2023

Tien raivaus ja ravien kaivuu

Puhdistamontien tason parantaminen aloitettiin 1.9.2023 raviojien puhdistamisella ja kaivuulla.



Kuva 1 Ravien raivausta



Kuva 2 Luiskien kaivuuta ja muotoilua



Kuva 3 Tien ravien kaivuuta




Kuva 4 Tien ravien kaivuuta

Raviojien kaivuun yhteydessä vesitaloutta parannettiin asentamalla 3 kpl uusia rumpuputkia.

Rummuilla voitiin ohjat kaikki vedet raviojista laskuojiin.

Suodatinkankaan ja kantavan murskeiden asennusta

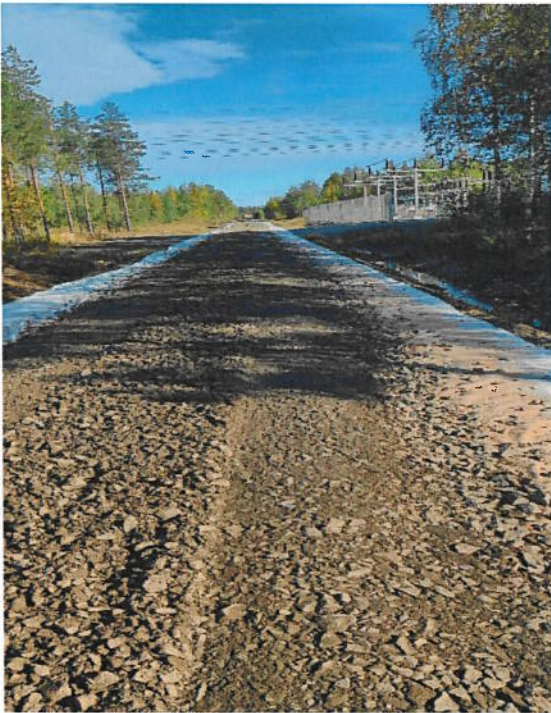

Kuva 5 Suodatin kankaan ja murskeen asennusta



Kuva 6 Murskeiden asennusta



Kuva 7 Murskeen asennusta



Kuva 8 Kääntöpaikka Puhdistamontien päässä

4. Syntyneet kustannukset

Kustannuksia syntyi ajalla 1.9-31.12.2023 yhteensä 54 422,98 € (veroton). Avustusta haetaan I-erässä 40 % kustannuksista 21 750 €.

5. Urakoitsijat

Maarakennusurakoitsijana on toiminut Kuljetus P. Luttinen Oy Pyhännältä. Hankinnat on kilpailutettu hankintalain mukaisesti.

Pyhännällä 18.1.2024

Timo Aitto-oja Tekninen johtaja/Pyhännän kunta

